

Protokół kontroli Nr 2
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 22.11.2024


Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Wanda Andziej
2. Dorota Wnuk
3. Jan Antczak

Kontrolą objęto: Zemdzienie publiczne pt.
Budowę, przebudowę i rozbudowę
świetlic wsielich w miejscowościach
Widunie, Peperzyn i Gęłki na
terenie Gminy Więcbork
w okresie: 2023

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- Zapoznaliśmy się z dokumentacją
prezypcyjną przedmiotowego zemdzienia
publicznego
- Dokonało przeglądu dokumentacji
prezypcyjnej
- Ad 1. Kosztorys inwestycji - 3sat
- Ad 2. Analiza ^{inwestycji} sprawy skierowanie kwoły
prezypcyjnej do realizacji według
prezypcyjnej i budżecie na 2023
- Ad 3. Zapoznanie się z treścią ogłoszenia prezypcyjnego
- Ad 4. Przegląd ofert.



W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Ad1. Kosztorys zartef wykonany przez projektanta CIM, podpisanych inwestycji

ELBITUNIA - 1545208,71 zł netto 1900600,71 (brutto),

PEPERZYN - 596160,89 zł netto 733277,89 (brutto)

JELEŃ - 436666,70 zł netto 537100,04 (brutto)

Łącznie krofeł - 2578036,30 zł netto 3170984,64 (brutto).

Ad2. W budżecie zrealizowano kwotę 3301250,00 zł
Zostawienie środków aby przystąpić do przetargu
Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w trybie
podstawowym bez pomocy (Ustawa Prawo zamówień publicznych
Art 275 pkt 1.) (z możliwością skreślenia ofert czynnych)

Ad3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych udn. 30.01.2023.

Ad4. Wniosek informacyjny jest w Biulet. Inform. Publicznej UM
Najmniejszą ofertą do każdej części zamówienia 218602
Podstawowe kryterium oceny ofert to cena i
oferowana gwarancja. Wyliczono 3 wykonawców
na poszczególne inwestycje

ELBITUNIA - Zakł. Bud. Zdz. Biocystki

PEPERZYN - HADU-KOR-KOZ. Koczak - Kanał

JELEŃ - Zakł. G. Kom. Sepolno K1

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

Nieprawidłowości nie stwierdzono

wyjaśnienia złożyli:


1. 

2. 


3. 

4. 

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny i dowody/

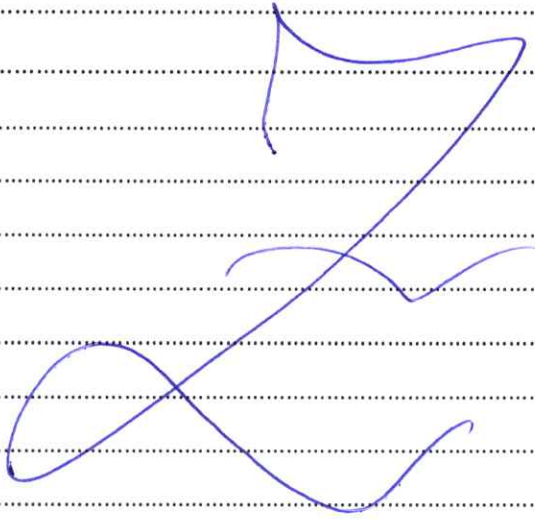

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:



Protokół kontroli sporządzono w *2* Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Dokumenty ekspertyznej i referencje
2. do inwestycji i planowanie prestiżowego
3. i raporty nieruchomościom.
4.
5.
6.

7.

8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018r.(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 października 2018r. poz.. 4951) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki , w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. 

2. 

3. 

**Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej**

1. 





/data: 

*Niepotrzebne skreślić
